

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA


SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

PESCARA

PAR-FAS 2007-2013 " LINEA DI AZIONE IV.2.I.A - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI - RIPROGRAMMAZIONE DI ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA. DELIBERA G.R. N. 114 DEL 17/02/2015

LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DI SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO DELLA FASCIA COSTIERA ESTERNA ALLA ZONA ATTIVA A COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI: MARTINSICURO, ALBA ADRIATICA, PINETO, SILVI, FRANCAVILLA AL MARE E ORTONA.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

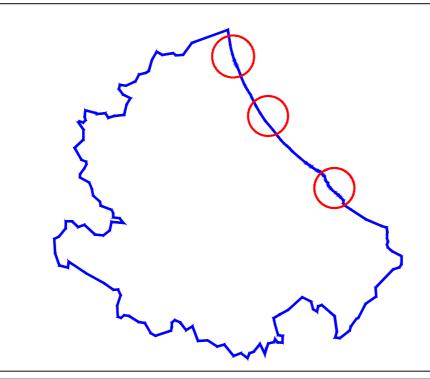

CRONOPROGRAMMA

I PROGETTISTI :	IL R.U.P.	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO	TAVOLA:
Ing. Luca IAGNEMMA Geom. Bruno BALDONERO	Geom. Roberto RICCI	Dott. Franco GERARDINI	Н
			SCALA
	Assistente al R.U.P.		DATA:
	Geol. Stefano CICHELLA		OTTOBRE 2018

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DI SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGINDELLA FASCIA COSTIERA ESTERNA ALLA ZONA ATTIVA A COMPLEMENTARIETA' DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA DEI COMUNI DI MARTINSICURO, ALBA ADRIATICA, PINETO, SILVI MARINA, FRANCAVILLA AL MARE E ORTONA.-

2											FEBB	RAIO							Т								MAF	RZO							
VOCE	LAVORAZIONE	INIZIO	FINE	1 2	3 4	5 6	7 8 9	10 1	1 12	13 14	15 16	6 17	18 19	20 21	1 22 2	3 24	25 26	27 28	1	2 3	4 5	6	7 8	9 10 1	11 12	13 14	15 10	6 17 18	3 19 2	20 21 22	23 24	4 25 2	6 27 3	28 29	30 31
1	BONIFICA BELLICA - LOTTO 1	1-feb	10-feb			Ш																													
1	BONIFICA BELLICA - LOTTO 2	11-feb	20-feb																																
1	BONIFICA BELLICA - LOTTO 3	21-feb	2-mar																																
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	3-mar	4-mar																																
2	RIPASCIMENTO - MARTINSICURO	5-mar	15-mar																																
	SMOBILITAZIONE CANTIERE	16-mar	17-mar																																
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	18-mar	19-mar																																
2	RIPASCIMENTO - ALBA ADRIATICA	20-mar	30-mar																																
	SMOBILITAZIONE CANTIERE	31-mar																																	
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																																		
2	RIPASCIMENTO - PINETO																																		
	SMOBILITAZIONE CANTIERE																																		
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																																		
2	RIPASCIMENTO - SILVI																																$\perp \perp$		
	SMOBILITAZIONE CANTIERE																																$\perp \perp$		
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																																		
2	RIPASCIMENTO - FRANCAVILLA																																		
	SMOBILITAZIONE CANTIERE																																		
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																																		
2	RIPASCIMENTO - ORTONA																																		
	SMOBILITAZIONE CANTIERE																																		
	TOTALE gg.59	1-feb	31-mar																																

<u>C</u>											APRI	LE											N	IAGGIO)						
VOCE	LAVORAZIONE	INIZIO	FINE	1 2	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14														14 15	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3											
1	BONIFICA BELLICA - LOTTO 1																														
1	BONIFICA BELLICA - LOTTO 2																														
1	BONIFICA BELLICA - LOTTO 3																														
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																														
2	RIPASCIMENTO - MARTINSICURO																														
	SMOBILITAZIONE CANTIERE																														
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																														
2	RIPASCIMENTO - ALBA ADRIATICA																														
	SMOBILITAZIONE CANTIERE		01-apr																												
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	02-apr	03-apr																												
2	RIPASCIMENTO - PINETO	04-apr	14-apr																												
	SMOBILITAZIONE CANTIERE	15-apr	16-apr																												
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	17-apr	18-apr																												
2	RIPASCIMENTO - SILVI	19-apr	29-apr																												
	SMOBILITAZIONE CANTIERE	30-apr	01-mag																												
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	02-mag	03-mag																												
2	RIPASCIMENTO - FRANCAVILLA	04-mag	14-mag																												
	SMOBILITAZIONE CANTIERE	15-mag	16-mag																												
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	17-mag	18-mag																											ot	
2	RIPASCIMENTO - ORTONA	19-mag	29-mag																												
	SMOBILITAZIONE CANTIERE	30-mag	31-mag																												
	TOTALE gg.61	01-apr	31-mag																												
